


CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, CON LA INTERVENCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ Y DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO, LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ÁNGEL ELADIO AGUIRRE RIVERO, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO, EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, C.P. JORGE SILVERIO SALGADO LEYVA, EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ING. JORGE ENRIQUE DÍAZ JIMÉNEZ, EL SECRETARIO DE FOMENTO TURÍSTICO, LIC. FEDERICO JAVIER ALUNI MONTES, EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, C.P. ANTONIO ARREDONDO ABURTO Y EL COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO, LIC. VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.
- II. Conforme los Artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con fecha 28 de febrero de 2014, el Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECTUR” y “LA ENTIDAD FEDERATIVA” celebraron el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, en adelante el CONVENIO, con objeto de que



“LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2014 le fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

III. En la Cláusula SEGUNDA del CONVENIO se determinó que el monto de los subsidios autorizados a otorgar por el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECTUR” a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, dentro del marco del programa presupuestario “S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, sería por un importe de \$230'000,000.00 (Doscientos Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los programas y proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Equipamiento Turístico	3a Etapa Equipamiento Museo Histórico Fuerte de San Diego	\$13'000,000.00
2	Infraestructura y Servicios	Infraestructura, servicios y equipamiento del Zócalo de Acapulco.	\$80'000,000.00
3	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación y Equipamiento de la Imagen urbana turística de La Quebrada.	\$20'000,000.00
4	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación y Equipamiento e Infraestructura y Servicios de Playa Manzanillo.	\$30'000,000.00
5	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación y Equipamiento e Infraestructura y Servicios de Playa Caleta y Caletilla.	\$35'000,000.00
6	Equipamiento Turístico	Rehabilitación de Servicios y Equipamiento Turístico de la Isla La Roqueta	\$12'000,000.00
7	Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los Proyectos	Asistencia Técnica y Servicios Relacionados a los proyectos (Estudio para el Diseño de un Programa de Manejo para la Roqueta).	\$3'000,000.00
8	Equipamiento Turístico	Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco (CAPTA)	\$5'000,000.00
9	Infraestructura y Servicios	Rescate de la fuente de la Diana	\$7'000,000.00
10	Equipamiento Turístico	Rehabilitación y Equipamiento de sitios de Interés Turísticos (Casa Borda-Museo de la Plata).	\$10'000,000.00
11	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación y Equipamiento de la Av. Escénica de Zihuatanejo	\$15'000,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$230'000,000.00

Asimismo, las características, responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

- IV. En la Cláusula **TERCERA** del **CONVENIO** se comprometió un monto total de recursos públicos destinados para los proyectos objeto del **CONVENIO**, por la cantidad total de \$255'000,000.00 (Doscientos Cincuenta y Cinco Millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará una cantidad de \$25'000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de “LA SECTUR”.
- V. Que con fecha 31 de Marzo de 2014, mediante oficio No. SFT/081/2014, emitido por el Lic. Javier Aluni Montes, Secretario de Fomento Turístico “LA ENTIDAD FEDERATIVA” solicitó a la “LA SECTUR”, realizar una modificación respecto a los proyectos señalados en el Anexo 1 y generar un Convenio Modificatorio al **CONVENIO**.
- VI. El segundo párrafo de la Cláusula **QUINTA** del **CONVENIO** dispone que los recursos objeto del subsidio se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; por lo que cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un convenio modificatorio.
- VII. La Cláusula **DÉCIMA OCTAVA** del **CONVENIO** establece que éste podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de los proyectos en que serán aplicados los subsidios otorgados, se sujetará a lo establecido en el numeral 4.1.5 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable.
- VIII. Con fecha 25 de junio de 2014, fue autorizada por el Comité Dictaminador del PRODERETUS la modificación de los proyectos, por medio de cual en el Anexo 1 del Convenio se realicen los siguientes ajustes:



- Cancelación de los proyectos denominados “3ª. Etapa Equipamiento Museo Histórico Fuente de San Diego”, “Infraestructura, servicios y equipamiento del Zócalo de Acapulco”, “Rehabilitación y Equipamiento de la Imagen urbana turística de La Quebrada”, “Rehabilitación y Equipamiento e Infraestructura y Servicios de Playa Manzanillo” y “Rehabilitación y Equipamiento de sitios de interés turístico (Casa Borda – Museo de la Plata)”.
- Adición de los proyectos denominados “1ª. Etapa de la Imagen Urbana y equipamiento del Circuito Turístico del Acapulco Tradicional (Calle Morelos)”, “Construcción del edificio del centro cultural y artesanal de las Siete Regiones del Estado de Guerrero”, “Creación del Museo de la Plata Taxco de Alarcón Pueblo Mágico”, “Videomapping Taxco de Alarcón Pueblo Mágico”, “Iluminación del Circuito Turístico del Pueblo Mágico Taxco de Alarcón” y “Sexta Etapa de la Rehabilitación Integral del Centro de Zihuatanejo”, contando con un monto federal el primero por \$25'000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), el segundo por \$20'000,000.00 (Veinte millones pesos 00/100 M.N.) ambos sin aportación estatal, el tercero por \$5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.), con una aportación estatal por la misma cantidad, el cuarto por \$2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con una aportación estatal por la misma cantidad, el quinto por \$2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con una aportación estatal por la misma cantidad y el sexto por \$6'000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) con una aportación estatal por la misma cantidad.
- Modificación en las aportaciones federales y estatales autorizadas para los proyectos denominados “Rehabilitación y Equipamiento e Infraestructura y Servicios de Playa Caleta y Caletilla”, “Rehabilitación de Servicios y Equipamiento Turístico de la Isla La Roqueta” y “Rehabilitación y Equipamiento de la Av. Escénica de Zihuatanejo”, para quedar en los términos señalados en la cláusula PRIMERA del presente Convenio Modificatorio.

DECLARACIONES

I. De “LA SECTUR”:

I.1 Que reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO.

II. De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:

II.1 Que reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO.

III. Comunes de “LA SECTUR” y de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:

III.1 Que reproducen y ratifican todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO, y adicionan las declaraciones III.3, III.4 y III.5, las cuales quedarán en los términos siguientes:



III.3 “LA SECTUR” manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación solicitada por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” en los términos señalados en los Antecedentes V y VIII del presente Convenio Modificatorio.

III.4 “LA ENTIDAD FEDERATIVA” manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación del CONVENIO en los términos señalados en el Antecedente No. VIII del presente Convenio Modificatorio.

III.5 La modificación a que se refiere este instrumento, es en relación a los proyectos contenidos en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12, así como la inclusión de los Anexos 13 y 14 y con ello, la distribución de los recursos comprometidos por las partes en el CONVENIO, lo que deriva en realizar las adecuaciones correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en modificar el CONVENIO, las Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta, así como los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12, así como la inclusión de los Anexos 13 y 14; por lo que manifiestan su conformidad para suscribir el presente Convenio Modificatorio en los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes convienen en modificar del CONVENIO relacionado en el Antecedente II de este instrumento y la Cláusula Segunda; Tercera y Cuarta para que su texto íntegro quede de la siguiente manera:

SEGUNDA.-MONTO DE LOS SUBSIDIOS AUTORIZADOS.- El Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECTUR” y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, por concepto de subsidios y dentro del programa presupuestario “S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, un importe de \$124'000,000.00 (Ciento veinticuatro millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los Proyectos	1ª. Etapa de la Imagen Urbana y equipamiento del Circuito Turístico del Acapulco Tradicional (Calle Morelos)	\$25'000,000.00
2	Creación de sitios de interés turístico	Construcción del edificio del centro cultural y artesanal de las Siete Regiones del Estado de Guerrero	\$20'000,000.00
3	Infraestructura y Servicios	Creación del Museo de la Plata Taxco de Alarcón Pueblo Mágico.	\$5'000,000.00



4	Equipamiento Turístico	Videomapping Taxco de Alarcón Pueblo Mágico	\$2'500,000.00
5	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación y Equipamiento e Infraestructura y Servicios de Playa Caleta y Caletilla.	\$25'000,000.00
6	Equipamiento Turístico	Rehabilitación de Servicios y Equipamiento Turístico de la Isla La Roqueta	\$14'000,000.00
7	Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los Proyectos	Asistencia Técnica y Servicios Relacionados a los proyectos (Estudio para el Diseño de un Programa de Manejo para la Roqueta).	\$3'000,000.00
8	Equipamiento Turístico	Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco (CAPTA)	\$5'000,000.00
9	Infraestructura y Servicios	Rescate de la fuente de la Diana	\$7'000,000.00
10	Infraestructura y Servicios	Iluminación del Circuito Turístico de Pueblo Mágico Taxco de Alarcón	\$2'500,000.00
11	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación y Equipamiento de la Av. Escénica de Zihuatanejo	\$9'000,000.00
12	Mejoramiento de Imagen Urbana	Sexta Etapa de Rehabilitación Integral del Centro de Zihuatanejo.	\$6'000,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$124'000,000.00

Las características responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

"LA SECTUR" se abstendrá de otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", los importes antes referidos en una sola exhibición, para ajustarse a los porcentajes, plazos y calendarios establecidos en cada uno de los proyectos de desarrollo turístico, señalados en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los proyectos objeto del presente convenio alcanzan un monto total de \$149'000,000.00 (Ciento cuarenta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.) de los cuales "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará una cantidad de \$25'000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que otorgará por parte de "LA SECTUR" conforme a lo establecido en la cláusula anterior.

A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos del artículo 4 Fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia



presupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; en cumplimiento a la dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas y su reglamento según corresponda.

CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS.- La radicación de los recursos públicos se realizará conforme a los porcentajes, calendarios de ejecución y el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas los cuales se precisan en los anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de este CONVENIO.

SEGUNDA.- Los anexos 3, 5, 10, 11 y 12 que se mencionan en las cláusulas modificadas en los términos de la cláusula anterior de este instrumento, se modifican de la misma manera y se agregan los anexos 13 y 14 al presente convenio modificatorio como parte integrante de él.

TERCERA.- Las partes acuerdan que a excepción de lo que expresamente se establece en este Convenio Modificatorio, el cual pasará a formar parte integrante del CONVENIO, las Cláusulas que no fueron modificadas continuarán vigentes en los términos y condiciones estipulados en el CONVENIO, por lo que éstas regirán y se aplicarán con toda su fuerza, subsistiendo plenamente todas las demás obligaciones y derechos contenidos en el mismo, salvo las modificaciones pactadas en este instrumento.

CUARTA.- Cualquier duda que surgiese por la interpretación de este instrumento o sobre los asuntos que no estén expresamente previstos en el mismo, las partes se sujetarán en todo momento a lo establecido en el CONVENIO.

QUINTA.- Este Convenio Modificatorio empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su suscripción y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico celebrado el 28 de Febrero de 2014; lo firman por quintuplicado de conformidad y para constancia, el día 30 de junio de 2014.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
"LA SECTUR":**

**POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO:**



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

**MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SALINAS,
SECRETARIA DE TURISMO.**

**LIC. ÁNGEL ELADIO AGUIRRE RIVERO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO.**

**C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO.**


**DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNEOLO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.**




LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ
KANFACHI,
DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO
TURÍSTICO.



C.P. JORGE SILVERIO SALGADO LEYVA,
SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.



ING. JORGE ENRIQUE DÍAZ JIMÉNEZ,
SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

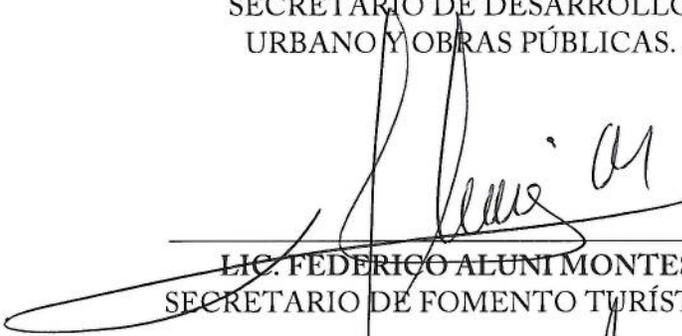

LIC. FEDERICO ALUNI MONTES,
SECRETARIO DE FOMENTO TURÍSTICO.



C.P. ANTONIO ARREDONDO ABURTO,
CONTRALOR GENERAL.

LIC. VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE,
COORDINADOR GENERAL COMITÉ DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO.



ANEXO 1

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, SUSCRITO CON EL ESTADO DE GUERRERO POR EL EJERCICIO 2014.

PROGRAMA DE TRABAJO PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2014

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Total
1	Infraestructura y Servicios	1ª. Etapa de la Imagen Urbana y equipamiento del Circuito Turístico del Acapulco Tradicional (Calle Morelos)	\$25'000,000.00	\$0.00	\$25'000,000.00
2	Infraestructura y Servicios	Construcción del edificio del centro cultural y artesanal de las Siete Regiones del Estado de Guerrero	\$20'000,000.00	\$0.00	\$20'000,000.00
3	Infraestructura y Servicios	Creación del Museo de la Plata Taxco de Alarcón Pueblo Mágico.	\$5'000,000.00	\$5'000,000.00	\$10'000,000.00
4	Equipamiento Turístico	Videomapping Taxco de Alarcón Pueblo Mágico	\$2'500,000.00	\$2'500,000.00	\$5'000,000.00
5	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación y Equipamiento e Infraestructura y Servicios de Playa Caleta y Caletilla.	\$25'000,000.00	\$0.00	\$25'000,000.00
6	Equipamiento Turístico	Rehabilitación de Servicios y Equipamiento Turístico de la Isla La Roqueta	\$14'000,000.00	\$0.00	\$14'000,000.00
7	Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los Proyectos	Asistencia Técnica y Servicios Relacionados a los proyectos (Estudio para el Diseño de un Programa de Manejo para la Roqueta).	\$3'000,000.00	\$0.00	\$3'000,000.00



ANEXO 2
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA
EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO
TURÍSTICO, SUSCRITO CON EL ESTADO DE GUERRERO POR EL
EJERCICIO 2014.

SEGUNDA PARTE DEL
PROGRAMA DE TRABAJO
PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2014

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Total
8	Equipamiento Turístico	Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco (CAPTA)	\$5'000,000.00	\$0.00	\$5'000,000.00
9	Infraestructura y Servicios	Rescate de la fuente de la Diana	\$7'000,000.00	\$0.00	\$7'000,000.00
10	Infraestructura y Servicios	Iluminación del Circuito Turístico de Pueblo Mágico Taxco de Alarcón	\$2'500,000.00	\$2'500,000.00	\$5'000,000.00
11	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación y Equipamiento de la Av. Escénica de Zihuatanejo	\$9'000,000.00	\$9'000,000.00	\$18'000,000.00
12	Mejoramiento de Imagen Urbana	Sexta Etapa de Rehabilitación Integral del Centro de Zihuatanejo.	\$6'000,000.00	\$6'000,000.00	\$12'000,000.00
TOTAL			\$124'000,000.00	\$25'000,000.00	\$149'000,000.00



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 3
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	1a. Etapa de la Imagen Urbana y equipamiento del Circuito Turístico del Acapulco Tradicional (Calle Morelos)		Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Asistencia Técnica y Servicios relacionados con los Proyectos			
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero			
Monto Comprometido	Federal	\$25,000,000.00	Estatal	
			Otro	

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100%	100%	100%
	%	%	%

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	Real			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESORE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESORE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente.	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESORE	

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 4
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	Construcción del Edificio del Centro Cultural y Artesanal de las siete regiones del Estado de Guerrero	Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Creación de Sitios de Interés Turístico		
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero		
Monto Comprometido	\$20,000,000.00	Federal	\$20,000,000.00
		Estatal	
		Otro	

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100%	100%	100%
	%	%	%

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014												Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2									
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	SECTUR	SHCP/TESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del ter mes	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	SECTUR	SHCP/TESOFE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar

**Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 5
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto**

Proyecto y/o Programa	Creación del Museo de la Playa Taxco de Alarcón Pueblo Mágico			Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios				
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero				
Monto Comprometido	Federal	\$5,000,000.00	Estatal	\$5,000,000.00	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferecia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa	
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %	100% %	

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	Recursos Totales	E	F	M	E	F	M	SECRETUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESORE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratista Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratista Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESORE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente.	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratista Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratista Local y/o Equivalente	
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratista Local y/o Equivalente	
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	F	M	E	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESORE	

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 6
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte:

de 2014

Proyecto y/o Programa	Rehabilitación y Equipamiento e Infraestructura y Servicios de Playa Caleta y Calchilla	
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios	
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero	
Monto Comprometido	Federal	\$25,000,000.00
	Estatal	\$25,000,000.00
	Otro	\$0.00

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones				
			1	2	3	4	1	2	3	4							
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHOPTESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicia Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Trazabilidad	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente SECRETUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente		
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 2do Trimestre	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente SECRETUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente		
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		

Programado

Realizado

En Proceso

Sin Realizar



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 7
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	Rehabilitación de Servicios y Equipamiento Turístico de la Isla La Roqueta	Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Equipamiento turístico		
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero		
Monto Comprometido	\$14,000,000.00	Federal	\$14,000,000.00
		Estatal	
		Otro	

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100%	100%	100%
	%	%	%

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	SECRETUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	SECRETUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente.	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 11
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	Videomapping Taxco de Alarcón Pueblo Mágico			Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Equipamiento Turístico				
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero				
Monto Comprometido	\$5,000,000.00	Federal	\$2,500,000.00	Estatal	\$2,500,000.00
				Otro	

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
3	Contratación	1 Contrato	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Prog E	Real E	Internos	Externos	

Programado

Realizado

En Proceso

Sin Realizar



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 12
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	Iluminación del Circuito Turístico de Pueblo Mágico Taxco de Alarcón				Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios					
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero					
Monto Comprometido	\$5,000,000.00	Federal	\$2,500,000.00	Estatal	\$2,500,000.00	Otro
Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa	
Avance al Mes del Reporte	100% %		100% %		100% %	

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	Real			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	JL	JL	O	E	SECTUR	SHCP/TESOF	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	M	M	S	S	D	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Certificado	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente.	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	E	JL	JL	O	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 13
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	Rehabilitación y Equipamiento de la Avenida Esclavica de Zihuatanejo				Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios					
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero					
Monto Comprometido	\$18 000 000.00	Federal	\$9 000 000.00	Estatal	\$9 000 000.00	Otro

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	SECTUR	SHCP/TRESSOF	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	E	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Guerrero
ANEXO 14
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte:

de 2014

Proyecto y/o Programa	Sexta Etapa de Rehabilitación Integral del Centro de Zihuatanejo				Mes del Reporte:
Tipo de Programa o Proyecto	Mejoramiento de Imagen Urbana				
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Fomento Turístico de Estado de Guerrero				
Monto Comprometido	Federal	\$6,000,000.00	Estatal	\$6,000,000.00	Otro
Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado		Avance Físico del Proyecto o Programa		
Avance al Mes del Reporte	100%	100%	100%	100%	

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	Real			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	F	F	F	E	F	SECRETUR	SHCP/TESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	W	M	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratadora Local y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratadora Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Estable.	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratadora Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratadora Local y/o Equivalente	
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contratadora Local y/o Equivalente	
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar



